

Nyt om renoveringen i

afd. 107 Porshøj

Nr. 9 - september 2023

FÆLLES
FREMTID

Nu rykker håndværkerne ind på Porshøj

For et par år siden sagde I beboere i afd. 107 'ja tak' til en renovering af jeres afdeling. Siden da er projektet blevet planlagt i detaljer, og i juni i år godkendte I de ændringer, der var foretaget under projekteringen. Det har taget lang tid, men nu er alt faldet på plads, og håndværkerne fra NCC kan starte op. I den kommende tid vil der ske følgende.

Uge 38 og frem

Levering af køreplader, hegn skurvogne ved nummer 1, 3, 5 og 7.

Uge 40

Byggepladsens hovedkontor vil blive etableret fra uge 40 på parkeringspladsen i midten af afdelingen på nordlig side. P-pladserne vil derfor ikke være tilgængelige.

Uge 41 - 42

Kloakarbejdet foran nr. 1, 3, 5 og 7 startes op midt i oktober. Generelt vil kloakarbejdet starte før selve renoveringen af en etape startes op. Der vil naturligvis tages hensyn og afskærmes omkring arbejdet.

Midt i oktober oprettes der desuden en indhegnet plads til materialer på pladsen ved siden af Coop365.

Uge 44

Nedriverne starter op i nr. 7 og herefter går de videre til nr. 1, 3 og 5.

Se
renoveringstidsplanen
på næste side.

Sikkerhed på byggepladsen

En byggeplads kan være et farligt sted, og der er naturligvis adgang forbudt for jer beboere.

Der bliver sat byggepladshegn op omkring byggepladsen for de enkelte etaper, så det er tydeligt, hvor I må færdes omkring pladsen. Vi beder alle respektere dette.

Container til storskrald

Der stilles to containere op ved nr. 3 og 7. Containerne kan benyttes til storskrald i forbindelse med oprydning, når I skal flytte til en permanent eller midlertidig genhusningsbolig.

Har du spørgsmål


Renovering

Projektleder

Lars Bækgaard

96 26 58 23

larb@faellesbo.dk



Genhusning

Genhusningsrådgiver

Mette Junge Povlsen

96 26 58 38

mjp@faellesbo.dk



Besøg vores hjemmeside [FÆLLESFREMTID.DK](https://faellesbo.dk)


Her finder du relevant information om helhedsplanen. F.eks. indretningsplaner, en oversigt over de kommende huslejer og referater fra beboermøderne.

FÆLLESBO 

Porshøj

Forventet byggeopstart

Dato: 06-06-2023

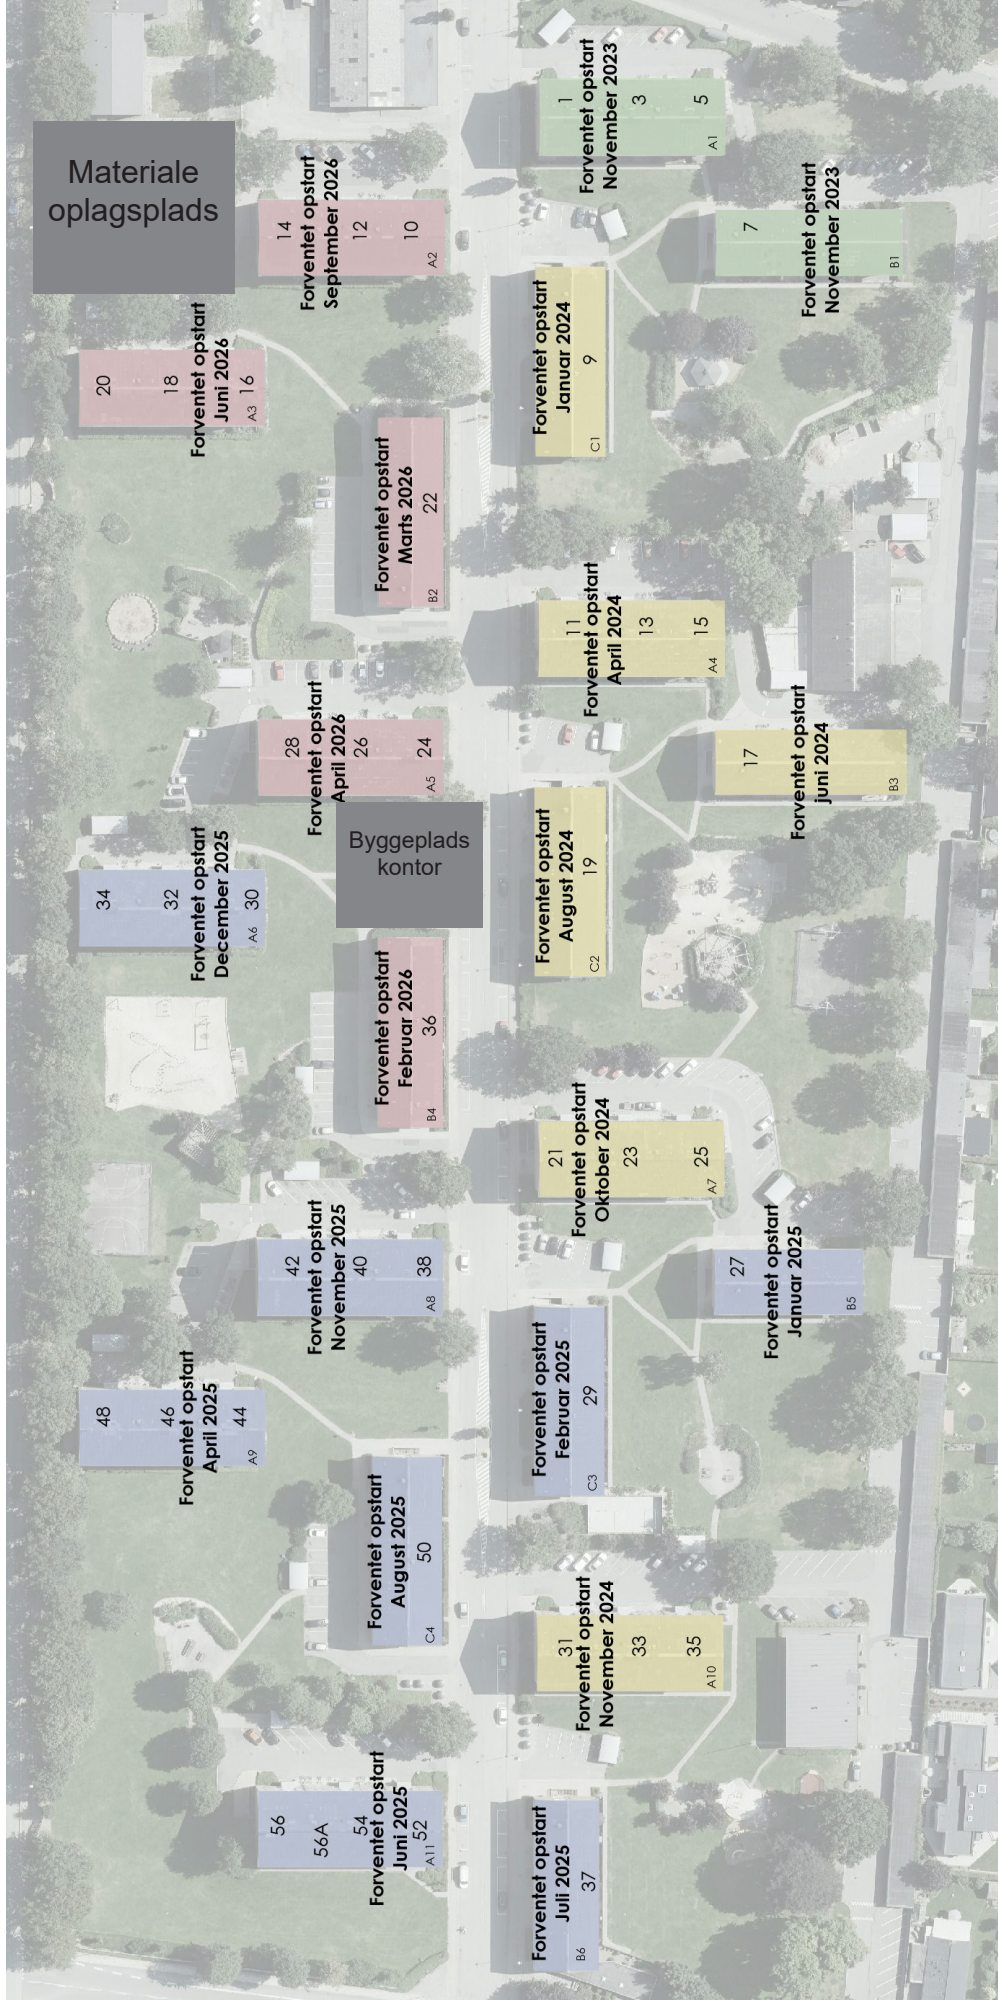

Forventet opstart 2025
Forventet opstart 2026

Forventet opstart 2023
Forventet opstart 2024
